Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko–Biała
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)

ZAŁĄCZNIK NR 1
GRAFICZNY POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
0	**Oświęcim - Obwodnica**	**542 dn**	**pią, 20-07-10**	**nie, 22-01-02**
1	**1 Wymagania ogólne**	**305 dn**	**pią, 20-07-10**	**pon, 21-05-10**
2	**1.1 Terminy formalno - prawne**			
3	1.1.1 Data Rozpoczęcia (Podpisanie umowy z Inwestorem)	0 dn	pią, 20-07-10	pią, 20-07-10
4	**1.2 Kamienie Milowe dla etapu prac projektowych**	**305 dn**	**pią, 20-07-10**	**pon, 21-05-10**
5	1.2.1 Kamień Milowy nr 1: Złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID	305 dn	pią, 20-07-10	pon, 21-05-10
6	**2 Prace projektowe**	**542 dn**	**pią, 20-07-10**	**nie, 22-01-02**
7	**2.1 Projekt budowlany (PB)**	**500 dn**	**pią, 20-07-10**	**nie, 21-11-21**
8	**2.1.1 Prace wstępne**	**35 dn**	**pią, 20-07-10**	**czw, 20-08-13**
9	2.1.1.1 Mobilizacja, Prace przygotowawcze	14 dn	pią, 20-07-10	czw, 20-07-23
10	2.1.1.2 Analiza materiałów wyjściowych	21 dn	pią, 20-07-24	czw, 20-08-13
11	2.1.1.3 Opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych (założenia projektowe do projektu budowlanego)	21 dn	pią, 20-07-24	czw, 20-08-13
12	**2.1.2 Warunki techniczne, warunki przyłączenia**	**111 dn**	**pią, 20-08-14**	**śro, 20-12-02**
13	2.1.2.1 Opracowanie wniosków o wydanie warunków technicznych	21 dn	pią, 20-08-14	czw, 20-09-03
14	2.1.2.2 Wydanie warunków technicznych przez gestorów	30 dn	pią, 20-09-04	sob, 20-10-03
15	2.1.2.3 Opracowanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia	30 dn	nie, 20-10-04	pon, 20-11-02
16	2.1.2.4 Wydanie warunków przyłączenia przez gestorów	30 dn	wto, 20-11-03	śro, 20-12-02
17	**2.1.3 Koncepcja systemu zarządzania ruchem**	**161 dn**	**pią, 20-08-14**	**czw, 21-01-21**
18	2.1.3.1 Opracowanie koncepcji SZR	112 dn	pią, 20-08-14	czw, 20-12-03
19	2.1.3.2 Koncepcja SZR - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	pią, 20-12-04	czw, 20-12-31
20	2.1.3.3 Koncepcja SZR - uzgodnienie przez Zamawiającego	21 dn	pią, 21-01-01	czw, 21-01-21
21	**2.1.4 Projekt budowlany**	**236 dn**	**pią, 20-08-14**	**wto, 21-04-06**
22	2.1.4.1 Projekt budowlany (wersja robocza)	50 dn	pią, 20-08-14	pią, 20-10-02
23	2.1.4.2 Projekt budowlany (wersja robocza) - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	sob, 20-10-03	pią, 20-10-30
24	2.1.4.3 Projekt budowlany - obiekty drogowe	110 dn	sob, 20-10-03	śro, 21-01-20
25	2.1.4.4 Projekt budowlany - infrastruktura	110 dn	nie, 20-10-04	czw, 21-01-21
26	2.1.4.5 Projekt budowlany - obiekty inżynierskie	110 dn	sob, 20-10-03	śro, 21-01-20
27	2.1.4.6 Opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień Projektu budowlanego	31 dn	pią, 21-01-22	nie, 21-02-21
28	2.1.4.7 Uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień dla Projektu budowlanego	30 dn	pon, 21-02-22	wto, 21-03-23
29	2.1.4.8 Projekt budowlany - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	pią, 21-01-22	czw, 21-02-18
30	**2.1.4.9 Projekt budowlany - zatwierdzenie dokumentu przez Inwestora**	14 dn	śro, 21-03-24	wto, 21-04-06
31	**2.1.5 ZUDP**	**44 dn**	**pią, 21-01-22**	**sob, 21-03-06**
32	2.1.5.1 Opracowanie materiałów do wniosku ZUDP	14 dn	pią, 21-01-22	czw, 21-02-04
33	2.1.5.2 Uzyskanie protokołu ZUDP	30 dn	pią, 21-02-05	sob, 21-03-06
34	**2.1.6 Pozwolenie wodnoprawne**	**90 dn**	**czw, 20-12-24**	**wto, 21-03-23**
35	2.1.6.1 Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego	60 dn	czw, 20-12-24	nie, 21-02-21
36	2.1.6.2 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego	30 dn	pon, 21-02-22	wto, 21-03-23
37	**2.1.7 Projekt stałej organizacji ruchu**	**124 dn**	**sob, 20-10-03**	**śro, 21-02-03**
38	2.1.7.1 Opracowanie PSOR	52 dn	sob, 20-10-03	pon, 20-11-23
39	2.1.7.2 Uzyskanie opinii do PSOR	30 dn	wto, 20-11-24	śro, 20-12-23
40	2.1.7.3 PSOR - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	czw, 20-12-24	śro, 21-01-20
41	2.1.7.4 Zatwierdzenie PSOR przez zarządcę drogi (GDDKiA)	14 dn	czw, 21-01-21	śro, 21-02-03
42	**2.1.8 Audyt BRD**	**48 dn**	**czw, 21-02-04**	**wto, 21-03-23**
43	2.1.8.1 Opracowanie materiałów do audytu BRD	14 dn	czw, 21-02-04	śro, 21-02-17
44	2.1.8.2 Procedura audytu BRD (GDDKiA)	14 dn	czw, 21-02-18	śro, 21-03-03
45	2.1.8.3 Stanowisko projektanta do wyniku audytu BRD (w razie konieczności)	7 dn	czw, 21-03-04	śro, 21-03-10
46	2.1.8.4 Uzasadnienie zarządcy drogi do raportu z audytu BRD	7 dn	czw, 21-03-11	śro, 21-03-17
47	2.1.8.5 Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w wyniku audytu BRD (w razie konieczności)	6 dn	czw, 21-03-18	wto, 21-03-23
48	**2.1.9 Plan działań ratowniczych**	**102 dn**	**wto, 20-12-22**	**pią, 21-04-02**
49	2.1.9.1 Opracowanie PDR (część techniczna)	30 dn	wto, 20-12-22	śro, 21-01-20
50	2.1.9.2 Uzyskanie opinii do PDR	30 dn	czw, 21-01-21	pią, 21-02-19
51	2.1.9.3 Uzgodnienie PDR (część techniczna) przez zarządcę drogi (GDDKiA)	14 dn	sob, 21-02-20	pią, 21-03-05
52	2.1.9.4 Zatwierdzenie PDR przez Inżyniera	28 dn	sob, 21-03-06	pią, 21-04-02
53	**2.1.10 Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRiD**	**56 dn**	**pon, 21-03-15**	**nie, 21-05-09**
54	2.1.10.1 Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID	21 dn	pon, 21-03-15	nie, 21-04-04
55	2.1.10.2 Opracowanie wniosków o wydanie opinii ZRiD	21 dn	pon, 21-03-15	nie, 21-04-04
56	2.1.10.3 Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID	30 dn	śro, 21-04-07	czw, 21-05-06
57	2.1.10.4 Wniosek o wydanie decyzji ZRID - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	śro, 21-04-07	wto, 21-05-04
58	2.1.10.5 Kompletowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID	3 dn	pią, 21-05-07	nie, 21-05-09
59	**2.1.11 PROCEDURA ZRiD**	**196 dn**	**pon, 21-05-10**	**nie, 21-11-21**
60	**2.1.11.1 Złożenie wniosku ZRID**	**1 dzień**	**pon, 21-05-10**	**pon, 21-05-10**
61	2.1.11.2 Weryfikacja wniosku przez właściwy organ i przekazanie do RDOŚ	60 dn	wto, 21-05-11	pią, 21-07-09
62	**2.1.11.3 Procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko**	**75 dn**	**sob, 21-07-10**	**śro, 21-09-22**
63	2.1.11.3.1 Weryfikacja wniosku przez RDOŚ	15 dn	sob, 21-07-10	sob, 21-07-24
64	2.1.11.3.2 Konsultacje społeczne	30 dn	nie, 21-07-25	pon, 21-08-23
65	2.1.11.3.3 Postępowanie RDOŚ + wydanie postanowienia	30 dn	wto, 21-08-24	śro, 21-09-22
66	2.1.11.4 Postępowanie ZRiD	30 dn	czw, 21-09-23	pią, 21-10-22

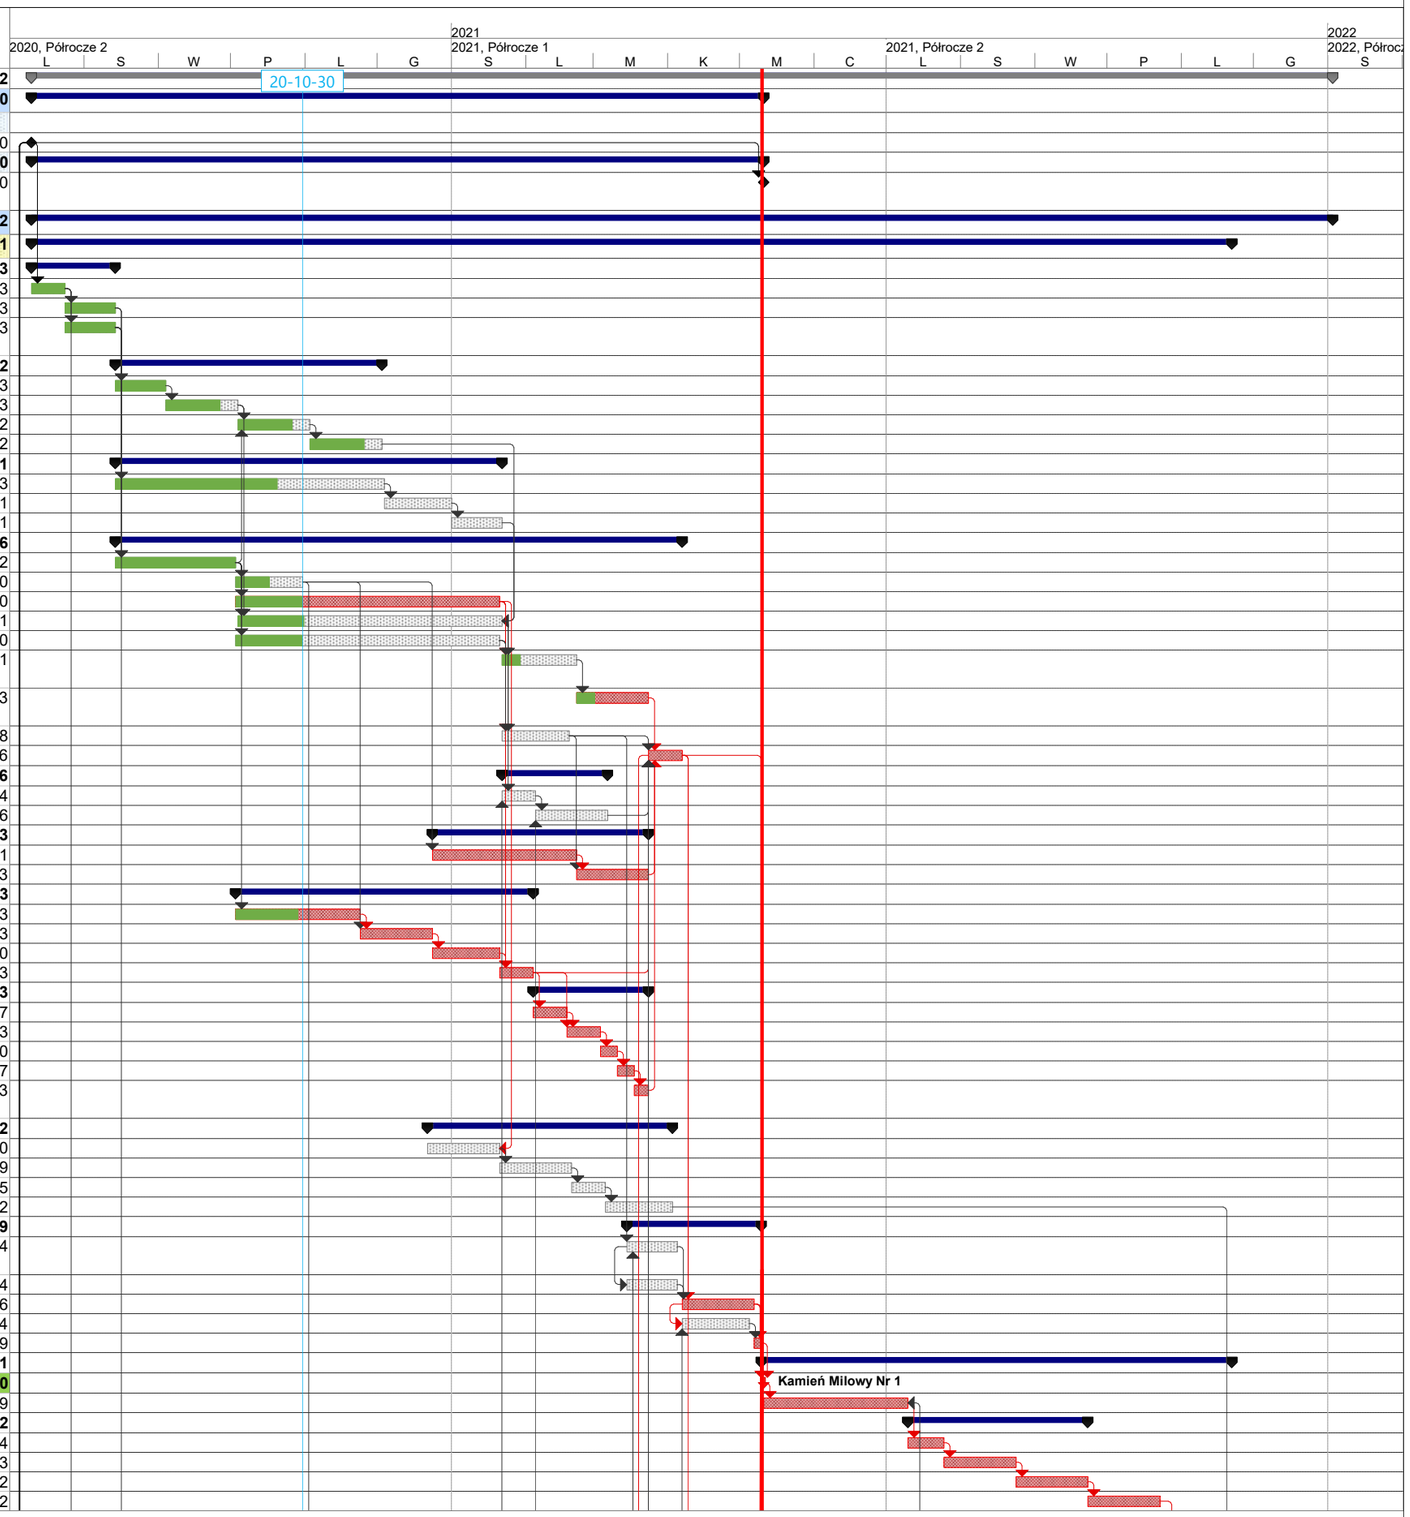

Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko–Biała
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)

ZAŁĄCZNIK NR 1
GRAFICZNY POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH
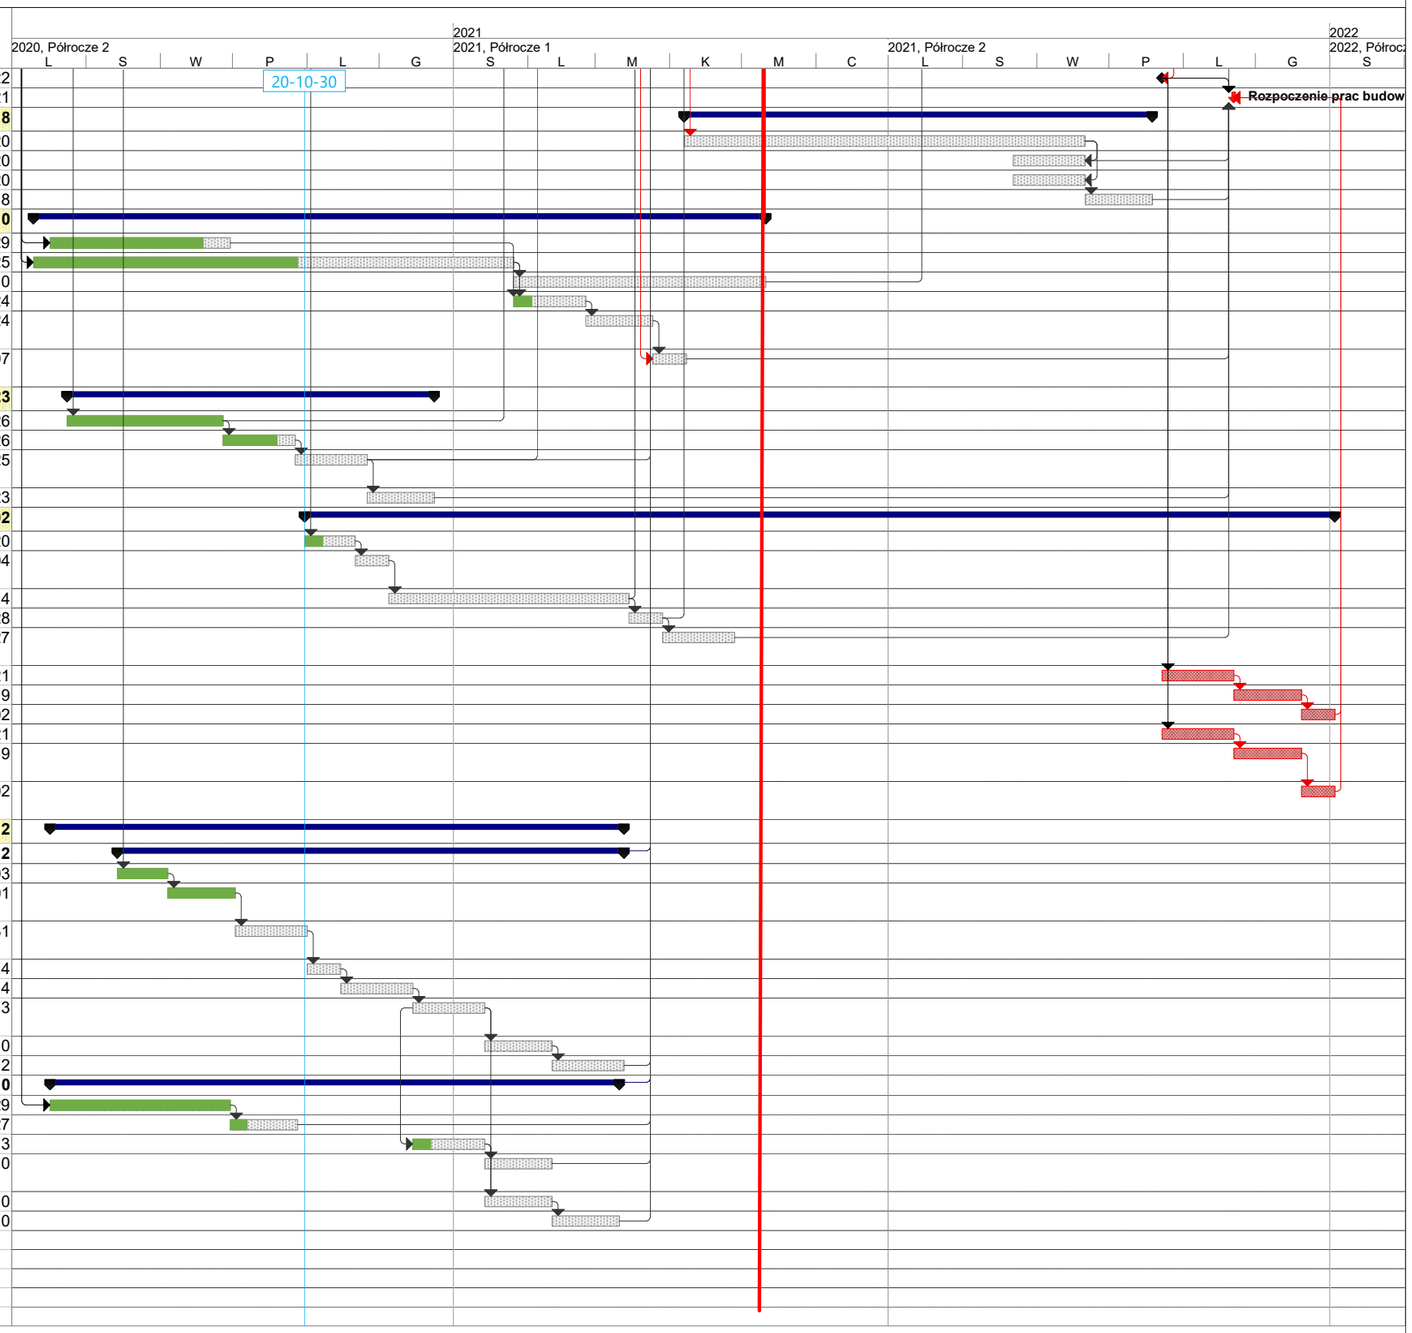
Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
67	2.1.11.5 Wydanie decyzji ZRID z rygorem	0 dn	pią, 21-10-22	pią, 21-10-22
68	2.1.11.6 Rozpoczęcie prac budowlanych	0 dn	nie, 21-11-21	nie, 21-11-21
69	**2.2 Projekt wykonawczy (PW)**	**195 dn**	**śro, 21-04-07**	**pon, 21-10-18**
70	2.2.1 Projekt wykonawczy	167 dn	śro, 21-04-07	pon, 21-09-20
71	2.2.2 STWiORB	30 dn	nie, 21-08-22	pon, 21-09-20
72	2.2.3 Przedmiary robót	30 dn	nie, 21-08-22	pon, 21-09-20
73	2.2.4 PW, PR i STWiORB - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	wto, 21-09-21	pon, 21-10-18
74	**2.3 Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko**	**305 dn**	**pią, 20-07-10**	**pon, 21-05-10**
75	2.3.1 Analiza akustyczna	75 dn	pią, 20-07-17	wto, 20-09-29
76	2.3.2 Inwentaryzacja przyrodnicza do opracowania raportu środowiskowego	200 dn	pią, 20-07-10	pon, 21-01-25
77	2.3.3 Inwentaryzacja przyrodnicza - kontynuacja	105 dn	wto, 21-01-26	pon, 21-05-10
78	2.3.4 Opracownie raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko	30 dn	wto, 21-01-26	śro, 21-02-24
79	2.3.5 Raport do ponownej oceny oddziaływania na środowisko - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	czw, 21-02-25	śro, 21-03-24
80	2.3.6 Raport do ponownej oceny oddziaływania na środowisko - zatwierdzenie dokumentu przez Inwestora	14 dn	czw, 21-03-25	śro, 21-04-07
81	**2.4 Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych**	**153 dn**	**pią, 20-07-24**	**śro, 20-12-23**
82	2.4.1 Prace terenowe wraz z opracowaniem wyników, aktualizacja mapy	65 dn	pią, 20-07-24	sob, 20-09-26
83	2.4.2 Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 dn	nie, 20-09-27	pon, 20-10-26
84	2.4.3 Przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli zatwierdzającej	30 dn	wto, 20-10-27	śro, 20-11-25
85	2.4.4 MDCP - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	czw, 20-11-26	śro, 20-12-23
86	**2.5 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna**	**429 dn**	**sob, 20-10-31**	**nie, 22-01-02**
87	2.5.1 Ustalenie przebiegu linii rozgraniczających	21 dn	sob, 20-10-31	pią, 20-11-20
88	2.5.2 Ustalenie przebiegu linii rozgraniczających - zatwierdzenie dokumentu przez Inwestora	14 dn	sob, 20-11-21	pią, 20-12-04
89	2.5.3 Projekty podziału nieruchomości	100 dn	sob, 20-12-05	nie, 21-03-14
90	2.5.4 Projekty podziału nieruchomości - zatwierdzenie dokumentu przez Inwestora	14 dn	pon, 21-03-15	nie, 21-03-28
91	2.5.5 Przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli zatwierdzającej	30 dn	pon, 21-03-29	wto, 21-04-27
92	2.5.6 Opis stanu nieruchomości	30 dn	sob, 21-10-23	nie, 21-11-21
93	2.5.7 Opis stanu nieruchomości - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	pon, 21-11-22	nie, 21-12-19
94	2.5.8 Opis stanu nieruchomości - zatiwerdzenie dokumenu przez Inwestora	14 dn	pon, 21-12-20	nie, 22-01-02
95	2.5.9 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla Zamawiającego	30 dn	sob, 21-10-23	nie, 21-11-21
96	2.5.10 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla Zamawiającego - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	pon, 21-11-22	nie, 21-12-19
97	2.5.11 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla Zamawiającego - zatwierdzenie dokumentu przez Inwestora	14 dn	pon, 21-12-20	nie, 22-01-02
98	**2.6 Geologia**	**239 dn**	**pią, 20-07-17**	**pią, 21-03-12**
99	**2.6.1 Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne**	**211 dn**	**pią, 20-08-14**	**pią, 21-03-12**
100	2.6.1.1 Projekt robót geologicznych i hydrogeologicznych	21 dn	pią, 20-08-14	czw, 20-09-03
101	2.6.1.2 Projekt robót geologicznych i hydrogeologicznych - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	pią, 20-09-04	czw, 20-10-01
102	2.6.1.3 Projekt robót geologicznych i hydrogeologicznych - zatwierdzenie przez właściwy organ	30 dn	pią, 20-10-02	sob, 20-10-31
103	2.6.1.4 Zgłoszenie robót geologicznych	14 dn	nie, 20-11-01	sob, 20-11-14
104	2.6.1.5 Wykonanie robót terenowych	30 dn	nie, 20-11-15	pon, 20-12-14
105	2.6.1.6 Opracowanie dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej	30 dn	wto, 20-12-15	śro, 21-01-13
106	2.6.1.7 Dodatek do DGI i DH - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	czw, 21-01-14	śro, 21-02-10
107	2.6.1.8 Uzyskanie decyzji zatwierdzającej DGI oraz DH	30 dn	czw, 21-02-11	pią, 21-03-12
108	**2.6.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych**	**237 dn**	**pią, 20-07-17**	**śro, 21-03-10**
109	2.6.2.1 Opinia geotechniczna	75 dn	pią, 20-07-17	wto, 20-09-29
110	2.6.2.2 Opinia geotechniczna - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	śro, 20-09-30	wto, 20-10-27
111	2.6.2.3 Dokumentacja badań podłoża gruntowego	30 dn	wto, 20-12-15	śro, 21-01-13
112	2.6.2.4 Dokumentacja badań podłoża gruntowego - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	czw, 21-01-14	śro, 21-02-10
113	2.6.2.5 Projekt geotechniczny	28 dn	czw, 21-01-14	śro, 21-02-10
114	2.6.2.6 Projekt geotechniczny - przegląd dokumentu przez Inżyniera	28 dn	czw, 21-02-11	śro, 21-03-10
